Città di Lodi

LODI PARK SYSTEM

AVVISO PUBBLICO INFORMALE DI SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 16, D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, SECONDO LA PROCEDURA DEL PROJECT FINANCING PER LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DELLE AREE DI SOSTA DESTINATE AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN SOPRA ELEVAZIONE.



PROGETTISTI

Ing. Alessandro Visentin Ing. Laura Romito

PROGETTO: LODI PARK SYSTEM - PFTE

TITOLO ELABORATO: CRONOPROGRAMMA

COD. ELABORATO: CR

REVISIONI: 02

DATA: 01/2026

Cronoprogramma

ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO
Sottoscrizione concessione		
Presentazione della proposta di Progetto esecutivo	1	8
Presentazione di eventuali osservazioni da parte del concedente e approvazione	9	4
NUOVO PARCHEGGIO SOPRAELEVATO VIA GENERAL MASSENA		
Presentazione della proposta di Progetto esecutivo	27	26
Presentazione di eventuali osservazioni da parte del concedente e approvazione	53	18
Ordini materiali	71	8
Opere per la realizzazione del nuovo parcheggio sopraelevato	79	52
Opere previsionali per recupero di stalli a pagamento provvisori sostitutivi di quelli interdetti al livello zero del nuovo parcheggio in via General Messena. Le opere consistono in: segnaletica orizzontale e verticale e spostamento di numero 2 parcometri.	79	5
SMART PARKING		
P.zza Mercato (in struttura)	13	1
V.le Savoia	13	1
Via Cavour	13	1
Via del Guasto	13	1
Via Tito Fanfulla	13	1
Via Fissiraga	13	1
Via Magenta (Solferino – Fanfulla)	14	1
Via Colleto Piazza	14	1
Via S. Francesco	14	1
Via S. Maria del Sole	14	1
Via Solferino	14	1
Via Valturno	14	1
Via XX Settembre (Valturno – Roma)	14	1
V.le Dante (a nord di Vignali)/P.zza Castello	14	1
Via Seconda Cremonesi (Donatori – L. Maggiore)	15	1
P.zza Ospitale	15	1
Via Benedetti	15	1
Via Bartaggio	15	1
Via Bassi	15	1
C.so Adda	15	1
Via XX Settembre (Roma - Marsala)	15	1
Via Magenta (Fanfulla – Eghezzone)	15	1
Via S. Giacomo	15	1
P.le 3 Agosto	16	1
P.le 3 Agosto (struttura)	16	1
Via Colle Eghezzone	16	1
C.so Archinti	16	1
Via XX Settembre (Ospitale – Valturno)	16	1
Via Lodino	16	1
Via Legnano	16	1
Via Pallavicino	16	1
Via Bassi (struttura)	16	1
Via Seconda Cremonesi (L. Maggiore – Mazzini)	16	1
Via Rossetti	17	1
Via Marsala	17	1
Via S. Martino	17	1
Via Carducci (Orfane-Legnano)	17	1
Via Carducci (Gorini-Orfane)	17	1
P.zza Zorinelli	17	1
Via Matteo Vaglio	17	1
Via Orfane	17	1
Via Maddalena	17	1
P.zza Zorinelli	17	1
Via della Costa	18	1
Via Gorini (a sud di via Giambelli)	18	1
Via XX Settembre (Marsala – M. d'Oro)	18	1
C.so Roma (San Martino – Gorini)	18	1
Via Gorini (Giambelli-Pallavicino) nord Giambelli	18	1
Via Lodovico Vistarini	18	1
Via Brocchieri	18	1
Via Pallavicino	18	1
Via Indipendenza	19	1
V.le IV Novembre	19	2
Via Borgo Adda (Caprera – Donatori)	20	1
C.so Mazzini (Cremonesi-Zorinelli)	20	1
P.le Fiume	20	1
Via Borgo Adda (Caprera – Granata)	19	1
Via Bastioni	19	1
Via Metà d'Elli	19	1
Via Mosè Bianchi	19	2
Via Padre Granata	20	1
Via Padre Granata/Barnabita	20	1
Lungo Adda Bonaparte	20	1
Via San Bassiano (lato nord)	21	1
V.le Dalmazia	21	1
V.le Dante Alighieri	21	1
Via Milite Ignoto	21	1
Via N. dall'Oro	21	1
Via Tommaseo	21	1
Via Trento Trieste	21	1
Via Villani	21	1
Viale Pavia	22	1
Via Defendente da Lodi	22	1
Via Defendente da Lodi (lato nord)	22	1
Via Vignati	22	1
Via Agnelli (a ovest di S. Colombano)	22	1
Polenghi (strada)	22	1
Polenghi (struttura)	23	2
Pll area ex Consorzio Agrario	24	1
Via San Bassiano (lato sud)	24	1
Via Benedetto Croce	23	1
Via Giovanni Gandini	23	1
Via dei Visconti	23	1
Via Agnelli (ad est di S. Colombano)	23	1
Via Ferari	24	1
Via dei Pescatori	24	1
Via Mattei	24	1
Via Biancardi Dionigi	24	1
P.zza Matteotti	25	1
C.so Mazzini (Cremonesi-Zalli)	25	2
Via Besana	25	2
Via Foscarelli	25	1
P.le Forni (struttura)	25	2
New Park - General Massena Pasa e messa in funzione casa automatica	125	4
Viale Trieste	53	1
Viale Pavia	53	1
Viale Agnelli	53	1
Area Fiume	54	1
SERVIZI AGGIUNTIVI		
Varchi ZTL	27	10
Punti Bike Sharing attrezzati	37	3

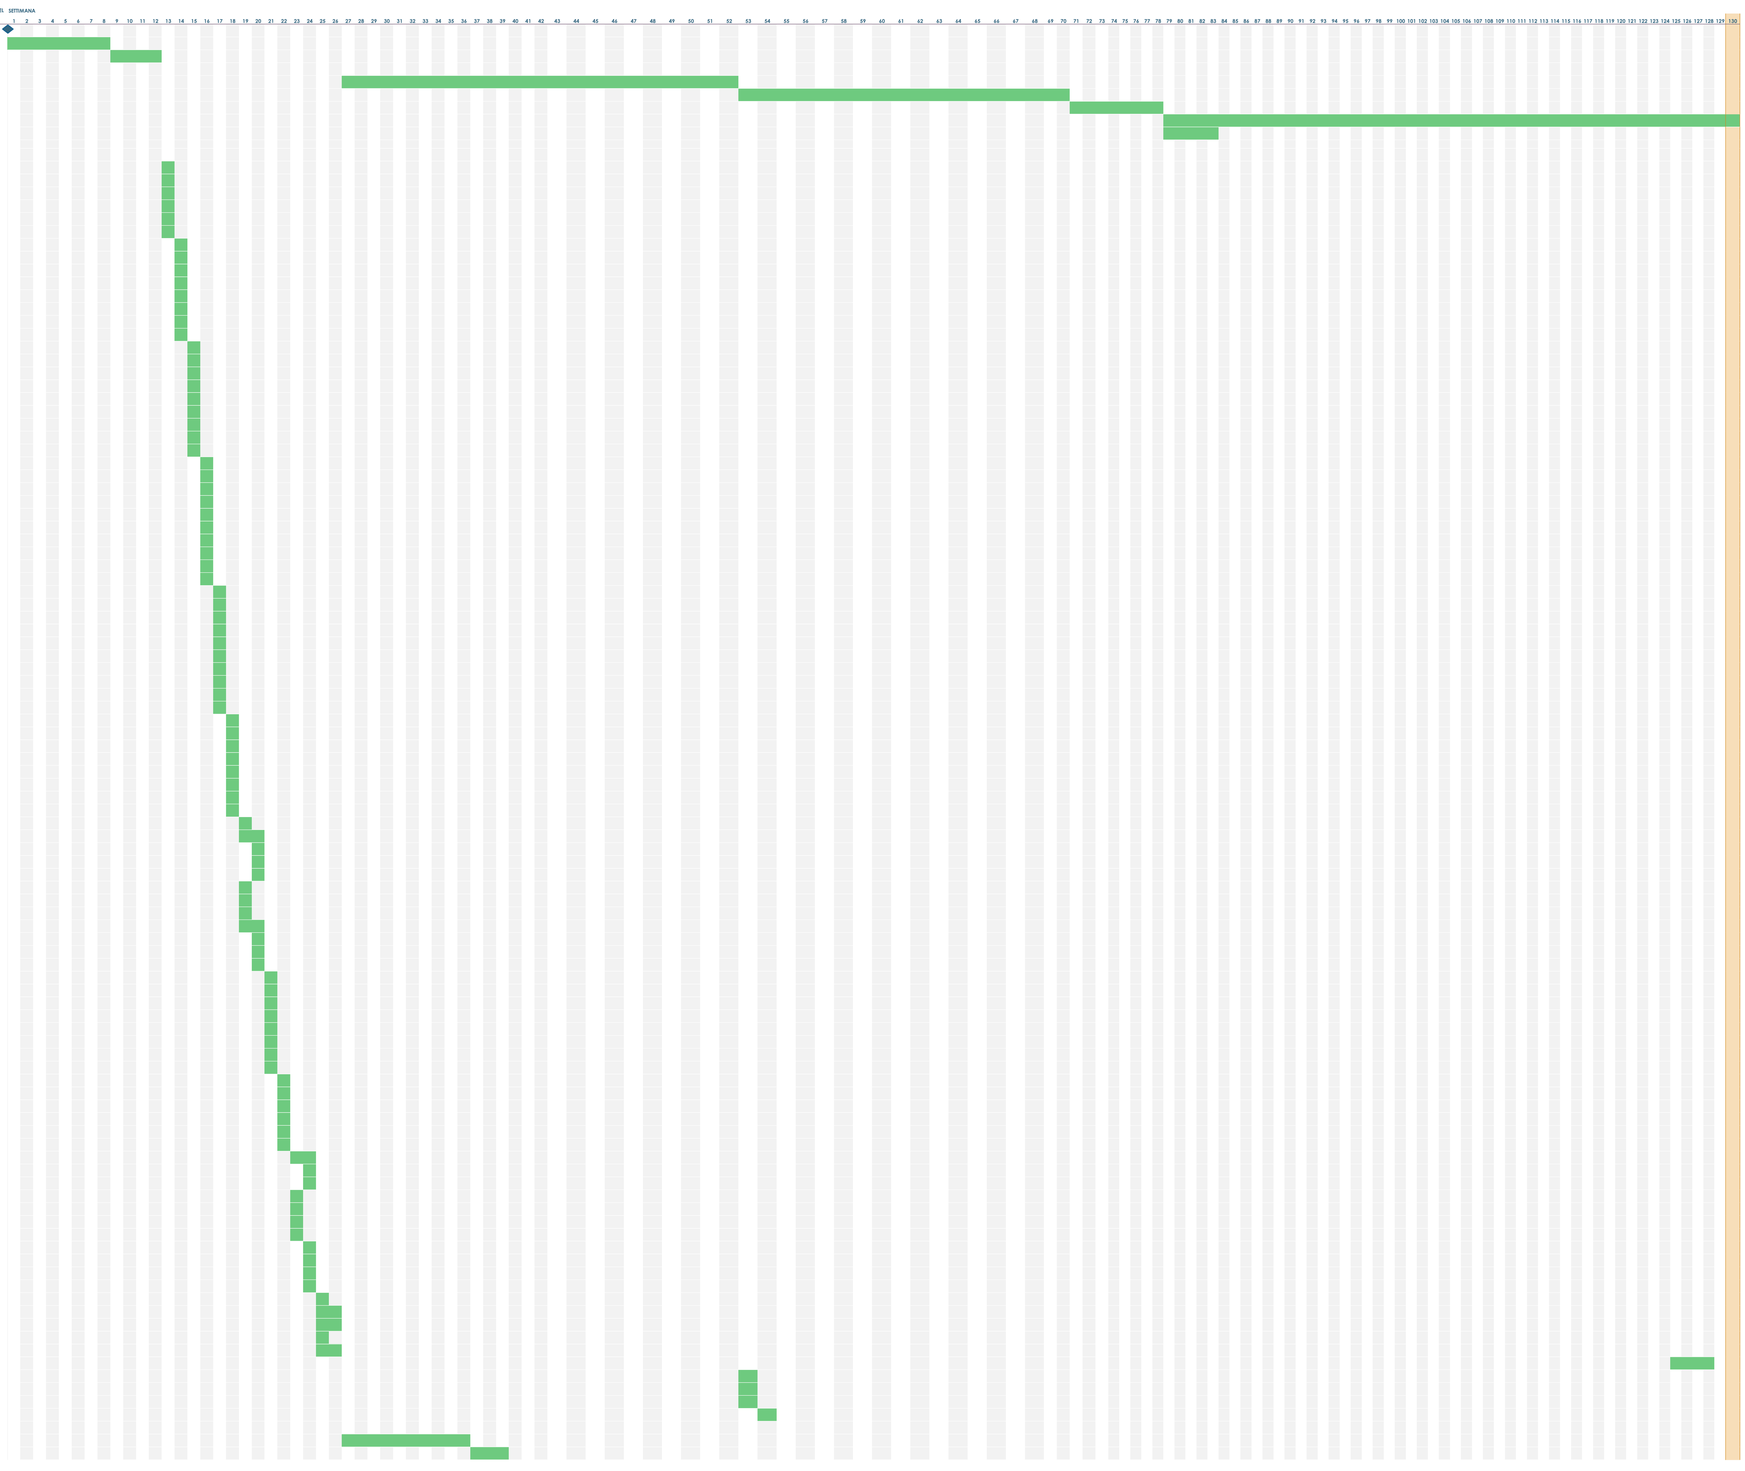

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Percheggio Via Massena, Lodi**	**255 g**	**lun 10/01/28**	**ven 29/12/28**
2	**Realizzazione**	**255 g**	**lun 10/01/28**	**ven 29/12/28**
3	Opere di cantieramento	10 g	lun 10/01/28	ven 21/01/28
4	Realizzazione opere di mitigazzione impatto del cantiere	10 g	lun 24/01/28	ven 04/02/28
5	Rimozione asfalti	10 g	lun 07/02/28	ven 18/02/28
6	Modifica Linea fognaria	15 g	lun 21/02/28	ven 10/03/28
7	Scavi parziali per Plinti	30 g	lun 13/03/28	ven 21/04/28
8	Realizzazione plinti	30 g	lun 24/04/28	ven 02/06/28
9	Realizzazione Nuovi asfalti	30 g	lun 22/05/28	ven 30/06/28
10	Montaggio struttura prefabbricata	100 g	lun 05/06/28	ven 20/10/28
11	Rimozione opere di mitigazione e ripristino percorsi ciclopedonali	10 g	lun 23/10/28	ven 03/11/28
12	Completamento impianti parcheggio	40 g	lun 25/09/28	ven 17/11/28
13	Opere di completamento e raccordo viabilità ed edifici esistenti	20 g	lun 23/10/28	ven 17/11/28
14	Realizzazione opere comlementari di finitura	20 g	lun 20/11/28	ven 15/12/28
15	Sistemazioni finali e collaudi	10 g	lun 18/12/28	ven 29/12/28

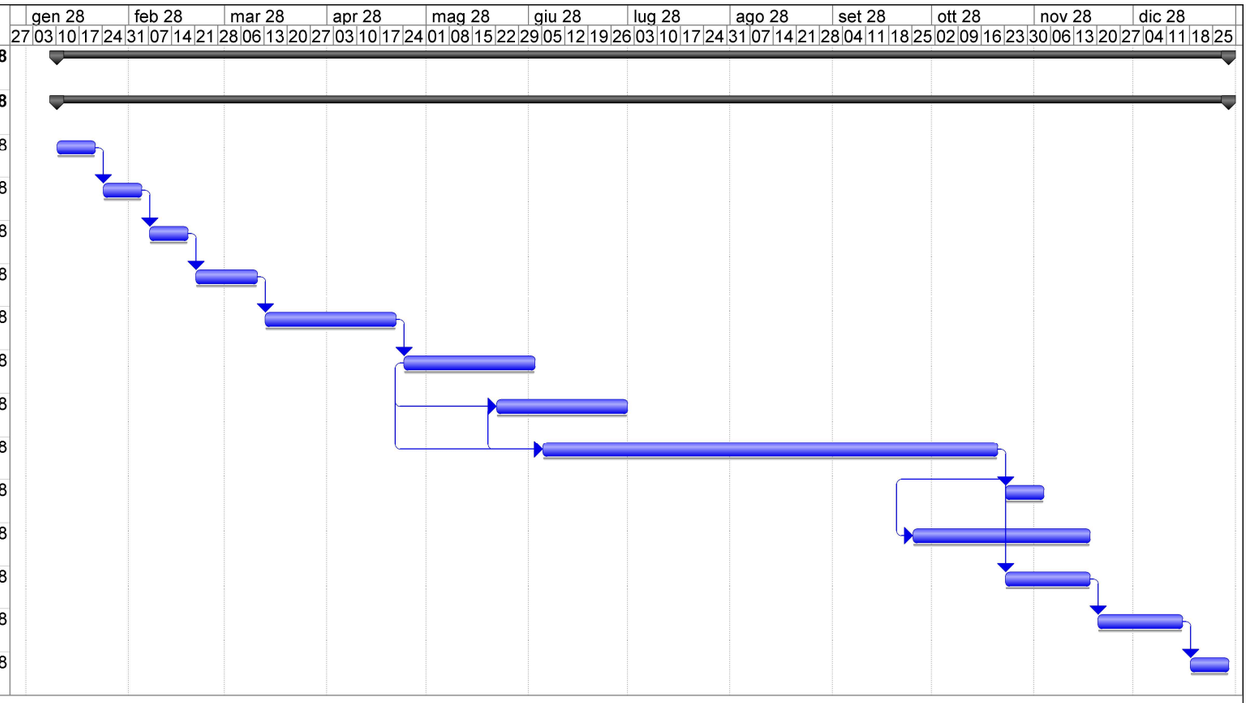

Progetto: 20260119_Gantt_Park Mas
Data: lun 19/01/26

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno
